




Município de
FAXINAL DO SOTURNO

MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RESUMO DOS CONTRATOS DE OBRAS - 2026

Nº CONTRATO	LICITAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	ORDEM DE INÍCIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA VIGÊNCIA (CONTRATUAL):	DATA VIGÊNCIA (EXECUÇÃO DA OBRA):	VALOR CONTRATADO	VALOR ADITIVADO	VALOR TOTAL	STATUS DA OBRA	BOLETINS DE MEDIÇÕES					VALOR MEDIDO ACUMULADO
													Nº	DATA	PERÍODO	VALOR (R\$)	% TOTAL EXECUTADA	
001/2023	TP 11/2022	C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA	15.161.740/0001-87	29/12/2023	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 2,500 ao km 1,850, extensão 650,00m.	12 Meses	31/12/2026	31/12/2026	R\$ 423.750,40	R\$ 78.136,11	R\$ 501.886,51	Em Execução	ADITIVO	02/10/2025	-	R\$ 28.891,07	5,76%	R\$ 28.891,07
													1	25/03/2026	29/12/2026 a 25/03/2026	R\$ 56.833,47	17,08%	R\$ 85.724,54
													01-a	25/03/2026	29/12/2026 a 25/03/2026	R\$ 6.591,69	18,39%	R\$ 92.316,23
													2					
													3					
													4					
001/2024	TP 05/2023	PGL CONSTRUTORA LTDA	33.924.295/0001-41	05/03/2024	Pavimentação de trecho da Estrada do Cerro Comprido (São Pio), Trecho do km 0,500 ao km 1,850, extensão 1.350,00m.	08 Meses	07/11/2026	02/09/2026	R\$ 1.006.538,51	R\$ 106.538,62	R\$ 1.113.077,13	Em execução	1	07/05/2024	05/03/2024 a 07/05/2024	R\$ 54.840,62	4,93%	R\$ 54.840,62
													2	24/01/2025	01/01/2025 a 24/01/2025	R\$ 22.993,57	6,99%	R\$ 77.834,19
													3	07/02/2025	25/01/2025 a 07/02/2025	R\$ 35.112,00	10,15%	R\$ 112.946,19
													4	21/02/2025	08/02/2025 a 21/02/2025	R\$ 31.954,57	13,02%	R\$ 144.900,76
													5	07/03/2025	22/02/2025 a 07/03/2025	R\$ 22.217,58	15,01%	R\$ 167.118,34
													6	21/03/2025	08/03/2025 a 21/03/2025	R\$ 43.436,74	18,92%	R\$ 210.555,08
													7	02/05/2025	22/03/2025 a 02/05/2025	R\$ 14.088,06	22,32%	R\$ 224.643,14
													8	16/06/2025	03/05/2025 a 16/06/2025	R\$ 13.460,92	21,39%	R\$ 238.104,06
													9	06/11/2025	16/06/2025 a 06/11/2025	R\$ 53.683,26	26,21%	R\$ 291.787,32
													10	21/11/2025	07/11/2025 a 21/11/2025	R\$ 48.518,96	30,57%	R\$ 340.306,28
													11	18/12/2025	22/11/2025 a 18/12/2025	R\$ 107.679,22	40,25%	R\$ 447.985,50
													12	15/01/2026	19/12/2025 a 15/01/2026	R\$ 62.913,80	45,90%	R\$ 510.899,30
													13	28/01/2026	16/01/2026 a 28/01/2026	R\$ 45.616,82	50,00%	R\$ 556.516,12
													14	05/03/2026	29/01/2026 a 05/03/2026	R\$ 101.911,42	59,15%	R\$ 658.427,54
													15	19/03/2026	06/03/2026 a 19/03/2026	R\$ 21.249,21	61,06%	R\$ 679.676,75
													01 - aditivo		-	R\$ 13.095,00	62,24%	R\$ 692.771,75
													16	01/04/2026	20/03/2026 a 01/04/2026	R\$ 39.242,54	65,76%	R\$ 732.014,29
													17	10/04/2026	02/04/2026 a 10/04/2026	R\$ 22.944,46	67,83%	R\$ 754.958,75
													18	23/04/2026	11/04/2026 a 23/04/2026	R\$ 25.237,61	70,09%	R\$ 780.196,36
													19	07/05/2026	24/04/2026 a 07/05/2026	R\$ 36.827,57	73,40%	R\$ 817.023,93
													20	20/05/2026	08/05/2026 a 20/05/2026	R\$ 23.231,46	75,49%	R\$ 840.255,39
													21	03/06/2026	21/05/2026 a 03/06/2026	R\$ 44.683,58	79,50%	R\$ 884.938,97
													22	25/06/2026	04/06/2026 a 25/06/2026	R\$ 34.979,68	82,65%	R\$ 919.918,65
													23	09/07/2026	26/06/2026 a 09/07/2026	R\$ 33.934,90	85,70%	R\$ 953.853,55
													02 - aditivo	19/08/2026		R\$ 4.365,00	86,09%	R\$ 958.218,55
													24	19/08/2026	10/07/2026 a 19/08/2026	R\$ 81.446,05	93,40%	R\$ 1.039.664,60
110/2024	Concorrência 05/2024	Vestena Comércio e Serviços LTDA	44.030.288/0001-12	06/12/2024	Pavimentação Trecho Estrada Novo Trevisu - 450,00 metros	07 meses	08/08/2026	02/08/2026	R\$ 439.890,00	R\$ 24.565,04	R\$ 464.455,04	FINALIZADA	1	23/01/2025	06/12/2024 a 23/01/2025	R\$ 26.992,48	6,14%	R\$ 26.992,48
													2	04/02/2025	24/01/2025 a 04/02/2025	R\$ 28.817,39	12,02%	R\$ 55.809,87
													3	06/03/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	R\$ 26.992,48	17,83%	R\$ 82.802,35
													4	13/03/2025	07/03/2025 a 13/03/2025	R\$ 30.366,54	25,73%	R\$ 113.168,89
													5	02/04/2025	14/03/2025 a 02/04/2025	R\$ 18.023,35	28,25%	R\$ 131.192,24
													6	06/06/2025	13/04/2025 a 06/06/2025	R\$ 50.069,74	39,03%	R\$ 181.261,98
													7	16/07/2025	07/06/2025 a 16/07/2025	R\$ 19.775,58	43,28%	R\$ 201.037,56
													8	13/10/2025	17/07/2025 a 13/10/2025	R\$ 37.114,66	51,28%	R\$ 238.152,22
													9	20/10/2025	14/10/2025 a 20/10/2025	R\$ 39.972,33	63,23%	R\$ 278.124,55
													10	11/11/2025	21/10/2025 a 11/11/2025	R\$ 50.094,52	70,67%	R\$ 328.219,07
													11	24/11/2025	12/11/2025 a 24/11/2025	R\$ 40.411,26	79,37%	R\$ 368.630,33
													12	03/12/2025	25/11/2025 a 03/12/2025	R\$ 16.870,30	83,00%	R\$ 385.500,63
													ADITIVO	20/02/2026	20/02/2026	R\$ 24.565,04	88,29%	R\$ 410.065,67
													13	20/02/2026	04/12/2025 a 20/02/2026	R\$ 21.750,65	92,97%	R\$ 431.816,32



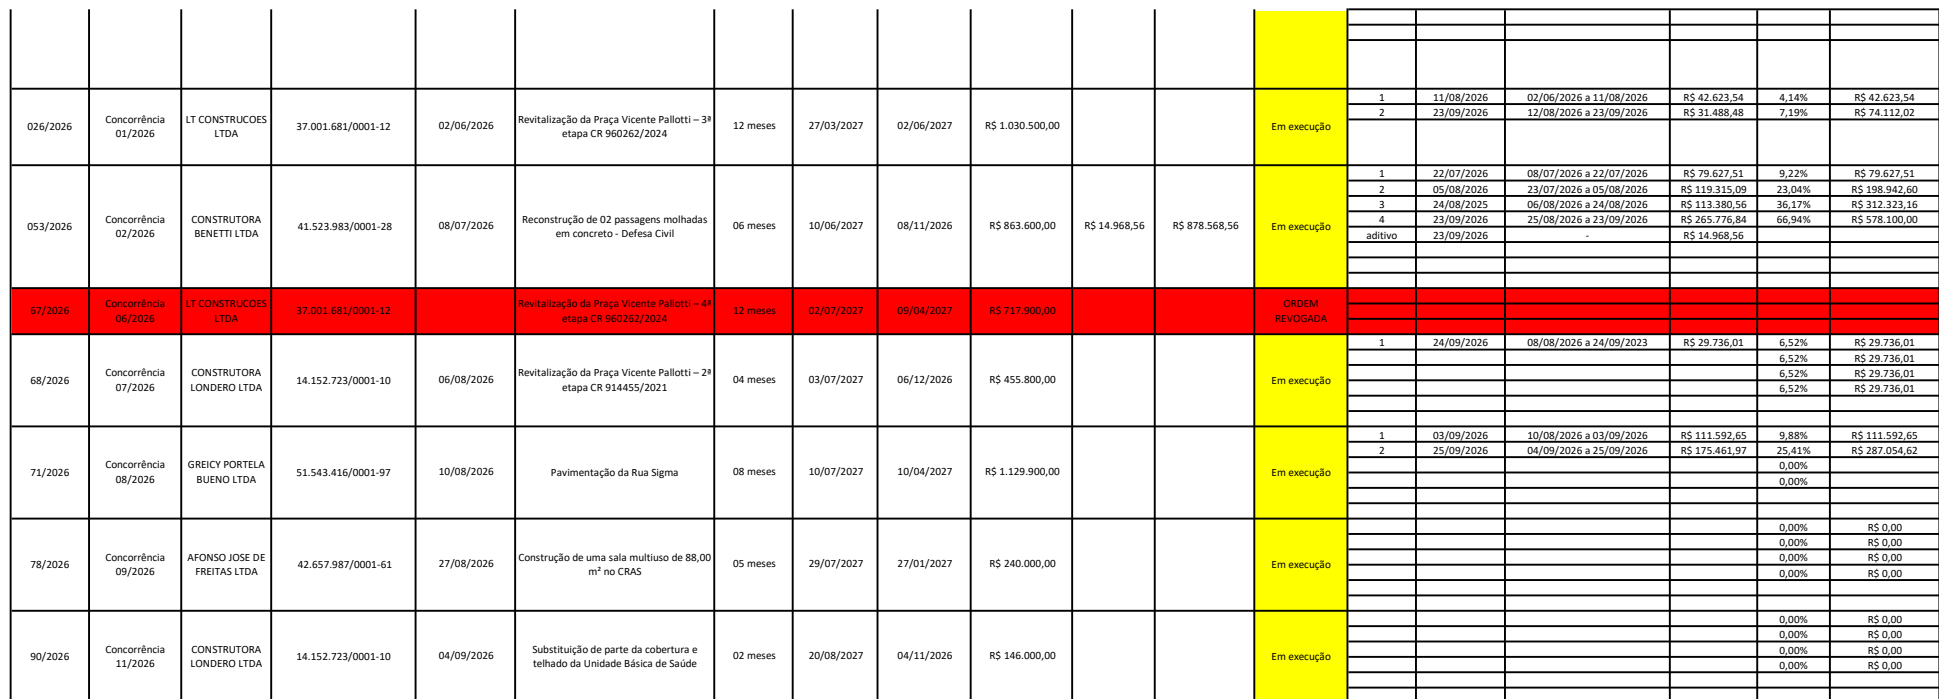

Nome: Kelli Manfio
CPF: ***.086.400-**

Assinado com certificado digital avançado

